

学生公寓热泵安装项目简报（第一期）

（供稿：环境管理科、新大正物业公司商务职业学院项目部）


为了给学生创造一个良好的生活环境，体验更加便捷、舒适的热水服务，学校将对 A、B、C、D、E、F，以及新建宿舍的热供水进行改造，最大化的满足学生的用水要求，环境管理科在后勤处两位处长领导下具体牵头该项目，在合同预算科、基建科、新大正物业公司商务职业学院项目部的共同配合下科学、安全、按时推进热水改造工作。具体工作进展如下：

第一周（7.19-7.25）：推进学生公寓 A、B、C、D 栋热水主管道闸阀、保温层，电磁阀、截止阀及室内末端水管水表拆除等工作。



第二周（7.26-8.1）：完成学生公寓 A、B、C、D 栋热水主管道闸阀、保温层，电磁阀、截止阀等安装及 12 号楼基础制作、

样板房安装。

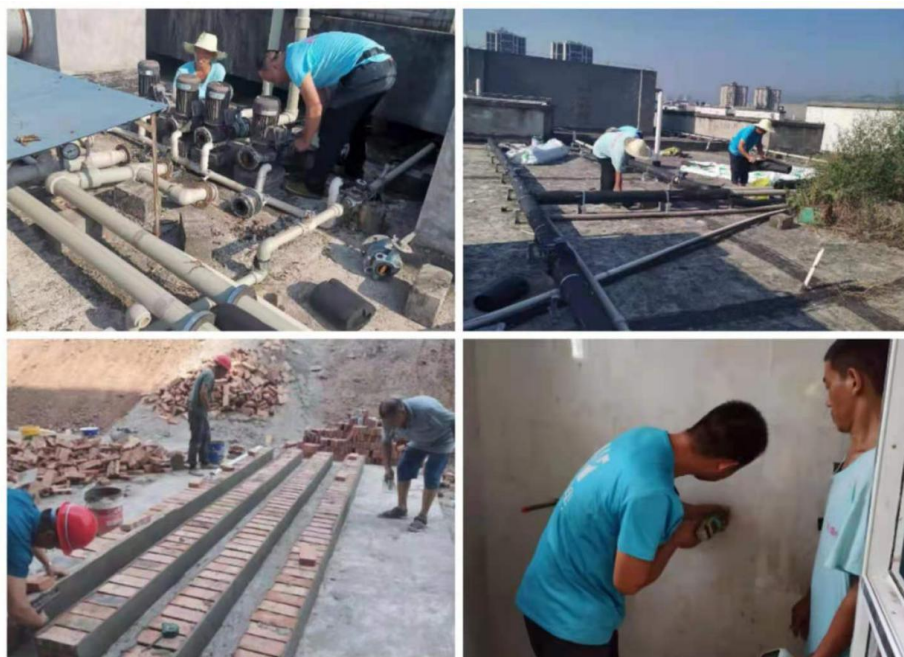

第三周（8.2-8.8）：做好对学生公寓热水系统主管道闸阀、保温层，电磁阀、截止阀等拆除部分进行验收并且完成了淋雨系统的确样工作。



